Documento: OCN-Informe Técnico Nº 12
Emitido por: GBOEHLER

Montajes de Accura Systems

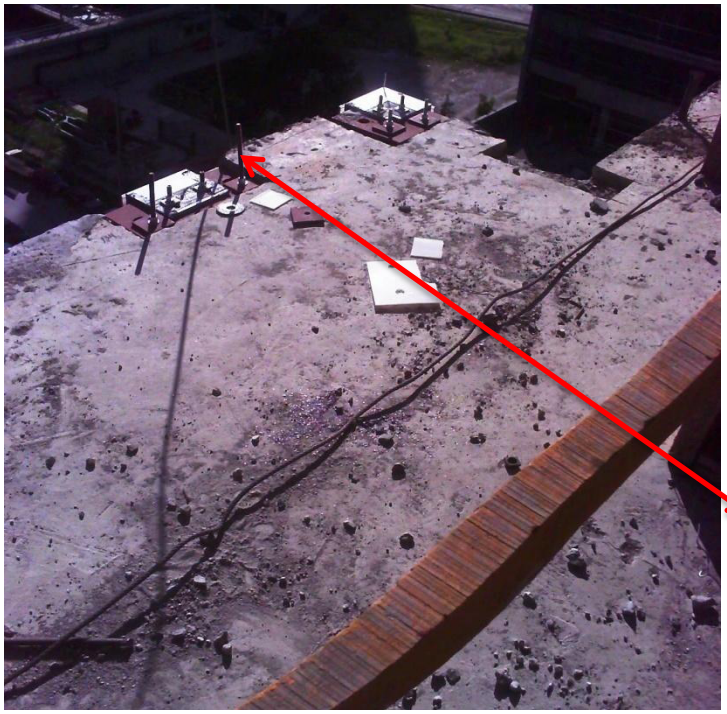

SYASA observa a ACCURA que la limpieza debe ser diaria ya que en los pisos hay cinta verde que usan para amarrar los módulos a los atriles, hay cartuchos de producto químico para anclaje, hay arandelas de metal, tornillos, anclajes, todo esto a pesar de que ACCURA tendrá perdidas o faltantes, ACCURA misma le costara reponer estos insumos.

Tambien se sigue observando por SYASA que ACCURA no ha cortado los tornillos con exceso de tamaño

SYASA observa a ACCURA que aproveche que aun no instala módulos para soldar las arandelas de acero a la placa de metal de acuerdo a plano DA02
